ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:

ПСК ПРОФИ

ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью
«ПСК Профи»

Генеральный директор

_____ / В.С. Попов /

м.п.

«___»_____2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Администрация г. Чулым Чулымского района Новосибирской области

_____ /_____/

м.п.

«___»_____202__ г.

Владелец автодороги (улицы): Администрация г. Чулым Чулымского района Новосибирской области

Организации согласующие ПОДД: ОГИБДД ОМВД России по Чулымскому району

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

УЛ. Островского

КМ 0+000 – КМ 0+14

г. Чулым, Чулымский район, Новосибирская область

Том –86, Томов – 135

Экземпляр – 1

Барнаул – 2023

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

ПОДД ул. Островского, г. Чулым, Чулымский район, Новосибирская область

Наименование организации	Должность	Согласовано /не согласовано, заключение	Дата заполнения, роспись, печать	Расшифровка росписи

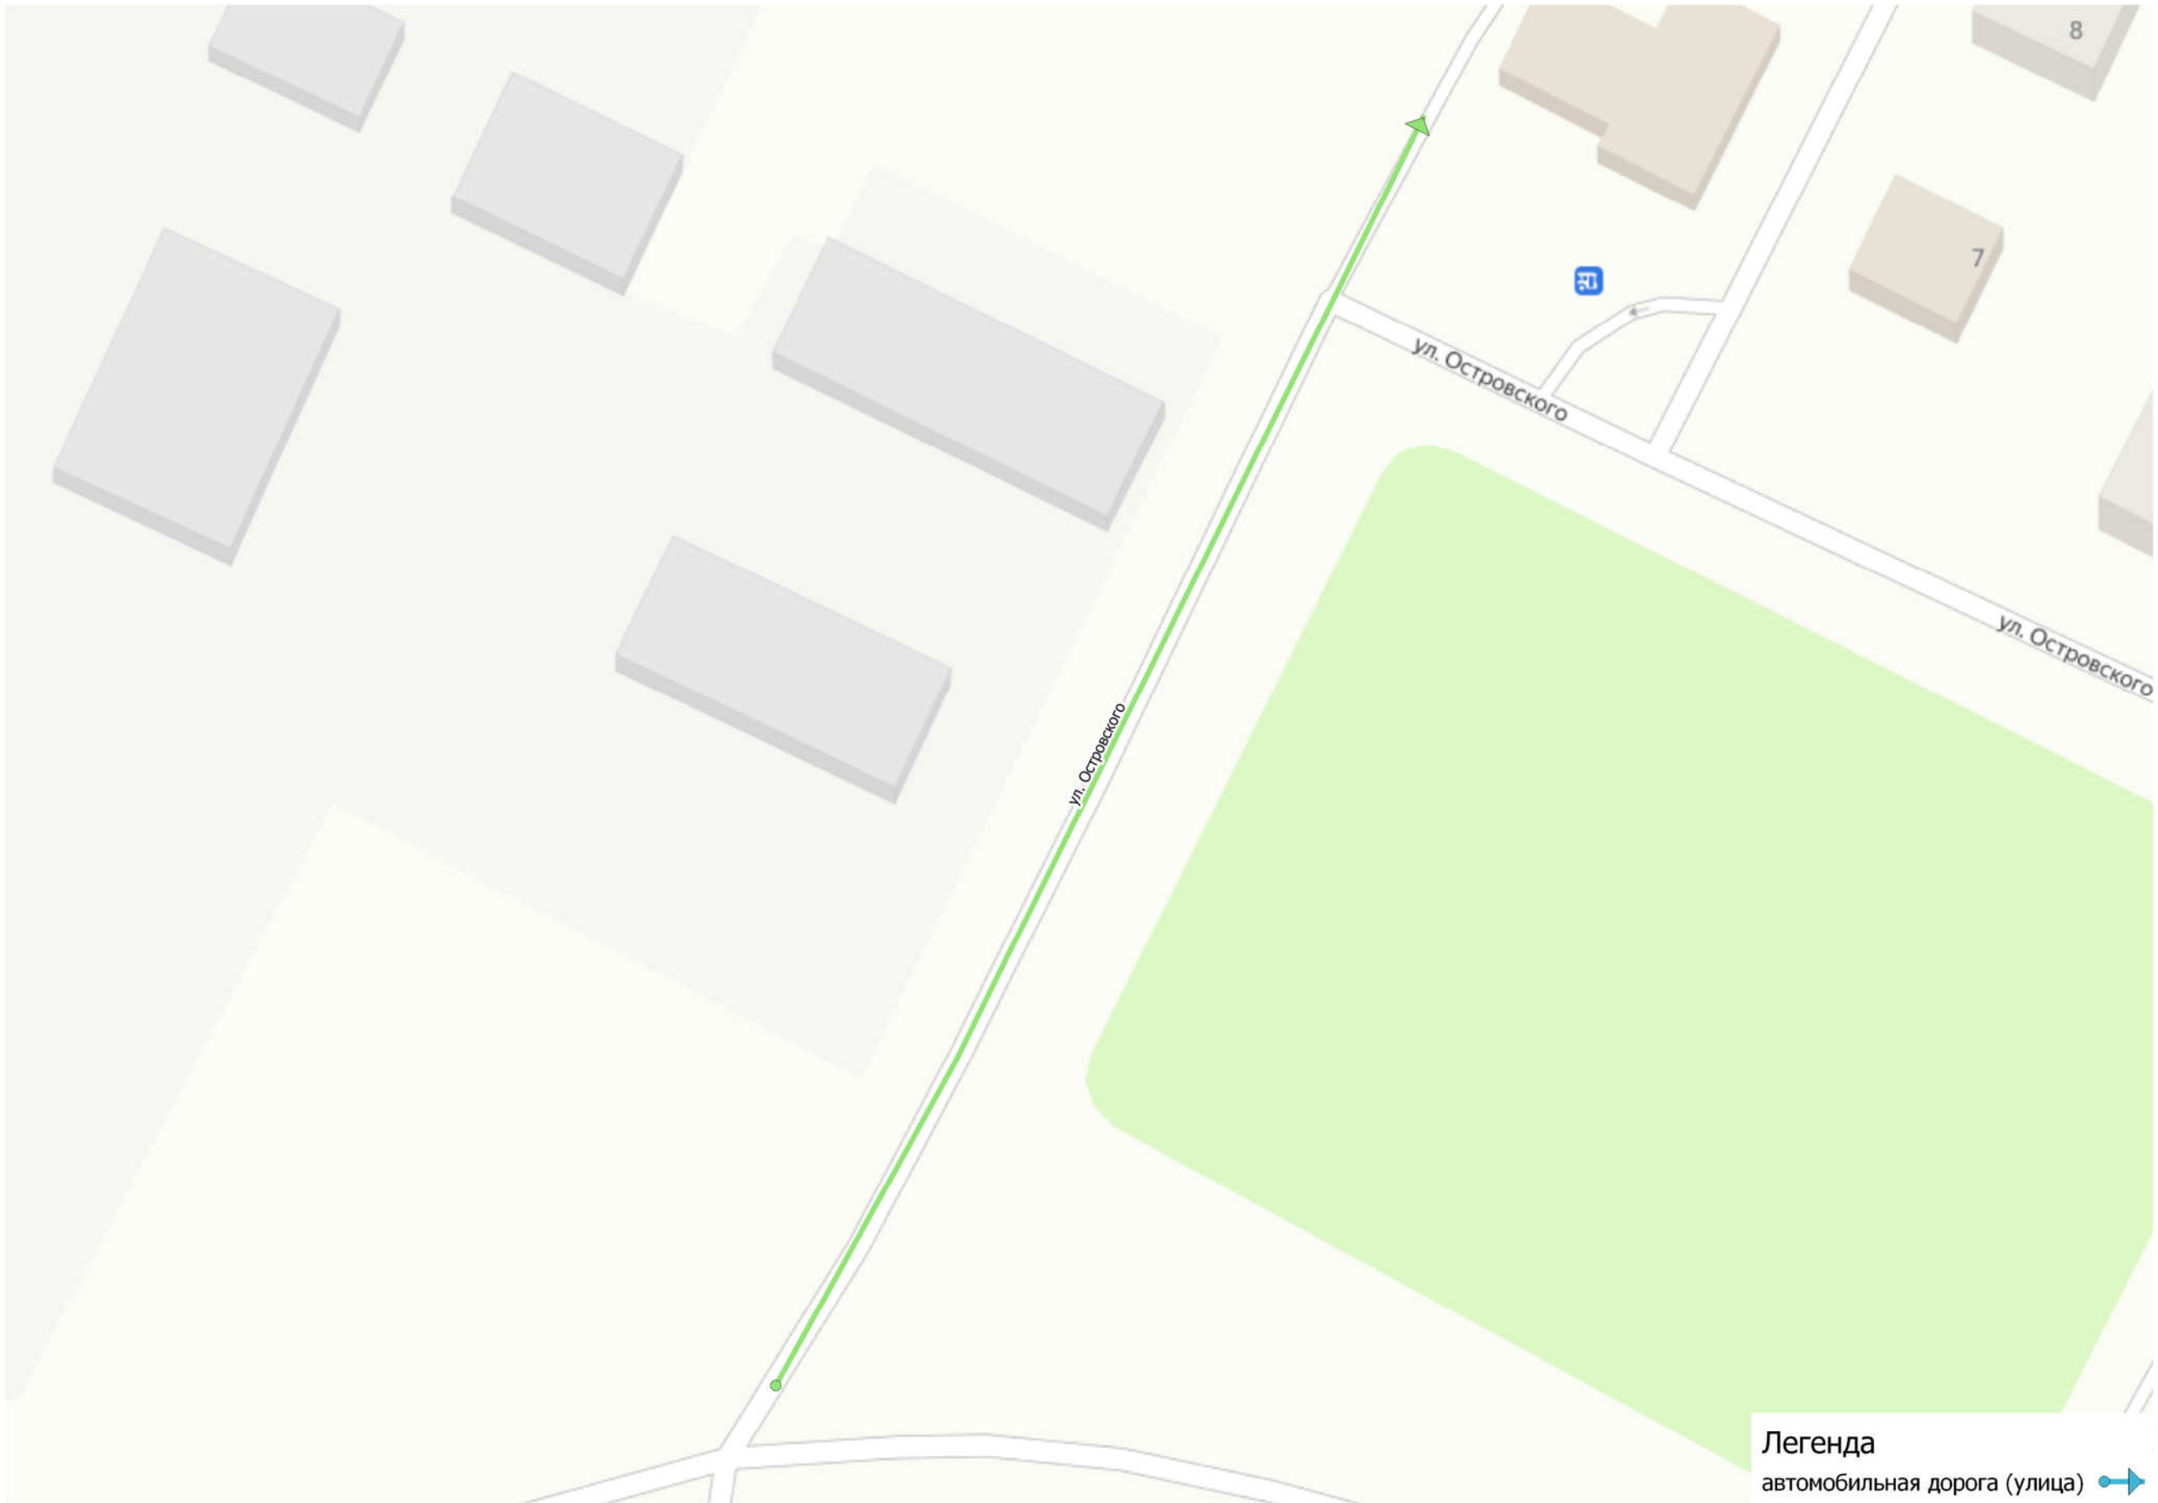
8
7
ул. Островского
ул. Островского
ул. Островского
Легенда
автомобильная дорога (улица)

Условные обозначения

	2.4 – существующий дорожный знак 2.4 – номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 0,009 – месторасположение знака		Существующие транспортные и пешеходные светофоры различных типов 0,009 (0,015; 0,027) – местоположение светофоров		Проектируемые сигнальные столбики 0,040 (0,060) – местоположение начала (конца) установки
	2.4 – проектируемый дорожный знак				Демонтируемые сигнальные столбики 0,040 (0,060) – местоположение начала (конца) установки
	2.4 – дорожный знак обслуживается сторонней организацией				
	2.4 – демонтируемый дорожный знак		Проектируемые транспортные и пешеходные светофоры различных типов 0,009 (0,015; 0,027) – местоположение светофоров		Существующее уличное освещение 0,031 – местоположение мачты освещения
	Существующий тротуар				
	Проектируемый тротуар				Проектируемое уличное освещение 0,031 – местоположение мачты освещения
	Демонтируемый тротуар		Покрытие проезжей части: асфальтобетон		Водоёмы, болото, водные потоки
	Горизонтальная дорожная разметка 1.6 – номер по ГОСТ Р 51256-2018		Покрытие проезжей части: гравий, щебень, песчано-гравийная смесь		Овраг, горные ущелья, склон местности
	Существующее дорожное ограждение 0,037 (0,052) – местоположение начала и конца ограждения		Покрытие проезжей части: цементобетон, ж/б плиты		Существующая автобусная остановка (павильон, площадка ожидания, посадочная площадка)
	Проектируемое дорожное ограждение 0,037 (0,052) – местоположение начала и конца ограждения		Покрытие проезжей части: грунт		
	Демонтируемое дорожное ограждение 0,037 (0,052) – местоположение начала и конца ограждения		Существующий комплекс фотовидеофиксации 0,040 – местоположение комплекса		Проектируемая автобусная остановка (павильон, площадка ожидания, посадочная площадка)
	Существующее пешеходное ограждение 0,037 (0,052) – местоположение начала и конца ограждения				
	Проектируемое пешеходное ограждение 0,037 (0,052) – местоположение начала и конца ограждения		Мостовое сооружение 0,047 (0,062) – местоположение начала и конца мостового сооружения 15 – длина		Демонтируемая автобусная остановка (павильон, площадка ожидания, посадочная площадка)
	Демонтируемое пешеходное ограждение 0,037 (0,052) – местоположение начала и конца ограждения				
	Бордюр существующий				
	Бордюр проектируемый		Существующая искусственная дорожная неровность		Водопропускная труба
	Бордюр демонтируемый				Вертикальная дорожная разметка 2.7 (2.1.1) – номер по ГОСТ Р 51256-2018
	Существующие сигнальные столбики 0,040 (0,060) – местоположение начала (конца) установки		Проектируемая искусственная дорожная неровность		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		

2. Чулым Новосибирская область
ул.Островского
0,000-0,140

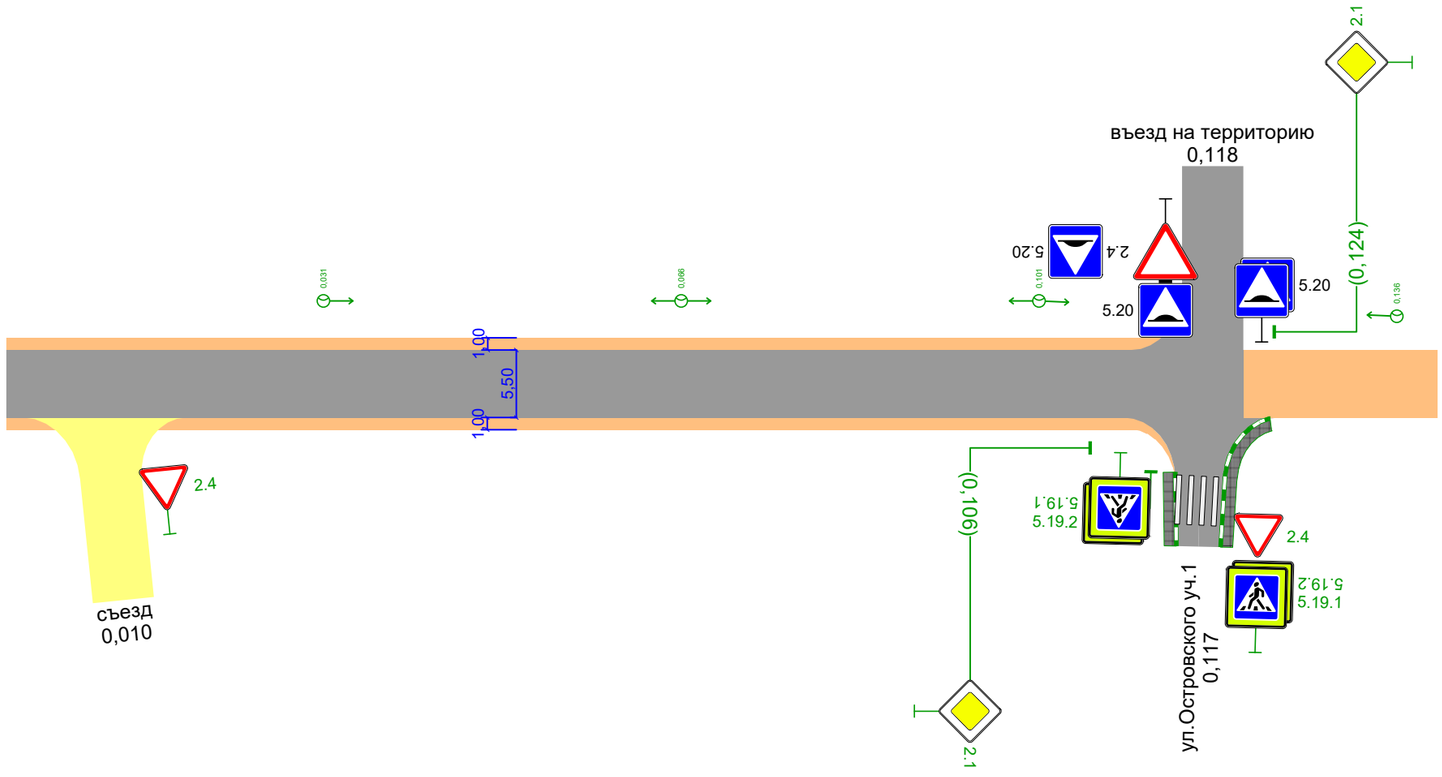

Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Ведомость размещения дорожных знаков

ул.Островского

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	I		0,015	Требуется	1	Примыкание справа на 0,010
2.1	Главная дорога	I		0,106	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		0,114	Установлено	1	Примыкание слева на 0,118
2.1	Главная дорога	I		0,124	Требуется	1	Слева
Итого установлено:	1						
Итого требуется:	3						
Итого к демонтажу:	0						
Итого:	4						
Знаки особых предписаний							
5.20	Искусственная неровность	II		0,114	Установлено	1	Примыкание слева на 0,118
5.20	Искусственная неровность	II		0,114	Установлено	1	Примыкание слева на 0,118
5.20	Искусственная неровность	II		0,122	Установлено	1	Примыкание слева на 0,118
5.20	Искусственная неровность	II		0,122	Установлено	1	Примыкание слева на 0,118
Итого установлено:	4						
Итого требуется:	0						
Итого к демонтажу:	0						
Итого:	4						
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	5						
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	3						
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0						
ВСЕГО:	8						

Ведомость размещения искусственного освещения

ул.Островского

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,031	0,136	Населённый пункт	4/4	105	Требуется	Левая кромка

Итого по дороге

Итого		
Состояние	**Опор/ светильников, шт**	**Протяженность, м**
Требуется	4/4	105
